INBETRIEBNAHMEANFORDERUNG
SAMSUNG WÄRMEPUMPE

SERVICE QUADRAT WÄRMEPUMPEN

FACHBETRIEB (AUFTRAGGEBER UND RECHNUNGSEMPFÄNGER)

Firma:

Vor- und Nachname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

BAUVORHABEN (STANDORT WÄRMEPUMPE)

Vor- und Nachname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Terminwunsch:

Großhandel: PLZ/Ort:

E-Mail:

ANLAGEDATEN / ANLAGE-NR.

Typ:

Seriennummer:

CHECKLISTE ZUR INBETRIEBNAHME

Heizgrenze:

Norm-AT:

Gebäudeheizlast bei Norm-AT:

Heizlast:

Sonstige:

2. Wärmeerzeuger:

Bivalenzpunkt:

FOLGENDE BEDINGUNGEN MÜSSEN ERFÜLLT SEIN:

- ☐ Anlage wurde entsprechend der Montageanleitung, Richtlinien und Verordnungen installiert und ist betriebsbereit. Der hydraulische Abgleich wurde durchgeführt.
- ☐ Druckprüfung/Spülung durchgeführt
- ☐ Wärmepumpe schwingungsentkoppelt angeschlossen
- ☐ Anlage vollständig und dauerhaft elektrifiziert (kein Baustrom)
- ☐ Pufferspeichertemperatur muss mind. +18° C betragen
- ☐ Heizungswasser entspricht der gültigen Norm

Um eine Inbetriebnahme durchführen zu können müssen alle entsprechenden Punkte der Checkliste erfüllt sein. Sollten diese Punkte nicht erfüllt sein und die Inbetriebnahme muss abgebrochen werden oder es entstehen Mehraufwendungen, wird dies in Rechnung gestellt. Es ist zwingend erforderlich, dass der zuständige Installateur und Elektriker bei der Inbetriebnahme mit vor Ort ist um eventuelle Mängel schnell zu beheben. Wird eine Wärmepumpenanlage zur Bauaustrocknung verwendet, ist dies ein nicht bestimmungsmäßiger Gebrauch, für auftretende Schäden wird keine Haftung übernommen.

INBETRIEBNAHMEANFORDERUNG
SAMSUNG WÄRMEPUMPE

SERVICE QUADRAT WÄRMEPUMPEN

LUFT-/WASSER-WÄRMEPUMPE AUSSENAUFSTELLUNG:

- ☐ Wärmepumpe fest montiert und gesichert
- ☐ Kondensatabführung frostsicher ausgeführt
- ☐ Sekundärseitige Vorrohrung frostsicher ausgeführt
- ☐ Bei Samsung Wärmepumpen der Baureihe EHS MONO R290: Die Aufstellvorschriften des Herstellers wurden berücksichtigt. Eine Nichteinhaltung dieser Vorgaben kann zum Abbruch der Inbetriebnahme führen
- ☐ Ich bestätige, dass ich die Aufstellvorschriften des Herstellers gelesen habe

BEMERKUNGEN

Ort / Datum

Auftraggeber / Stempel / Unterschrift

AUFSTELLVORSCHRIFTEN DES HERSTELLERS FÜR
SAMSUNG WÄRMEPUMPEN DER BAUREIHE EHS MONO R290

Außengerät Mindestabstände

Als Faustregel gilt: Abstand zu...

- Fenstern
- Türen
- Lüftungsöffnungen
- Lichtschächten
- Kellerzugängen
- Flachdachfenstern

... von der Aufstellungsfläche der Wärmepumpe auf dem Boden mindestens 1 Meter und an der Oberkante der Wärmepumpe einen 1/2 Meter.

Der Schutzbereich um die Wärmepumpe darf sich nicht auf Parkplätze, Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

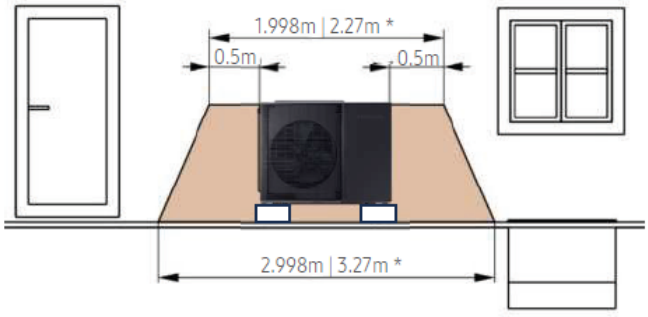



*) Breite Außeneinheit: 998mm Mono R290 5+8 | 1270mm Mono R290 12+16
